



Commune : APATOU

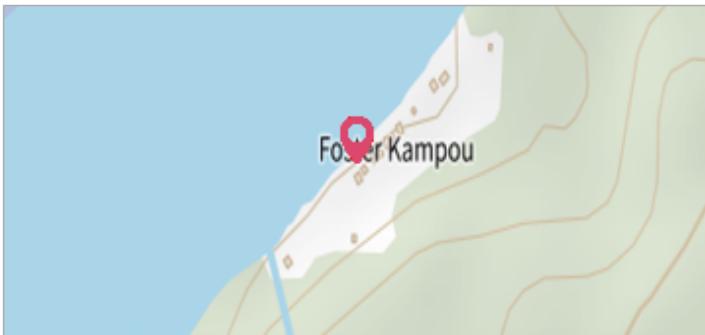
Rivière : Le Maroni

## Maison bois rouge sur dalle

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_gin09\_S\_16**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 10/10/2017

Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.37691700 / Y: 5.10164400**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 125497.48 / Y: 564882.13**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.376917 / Y: 5.101644**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_gin09\_R\_16\_1**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :**

17/04/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT INITIAL - 30/01/2009

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.950 m
