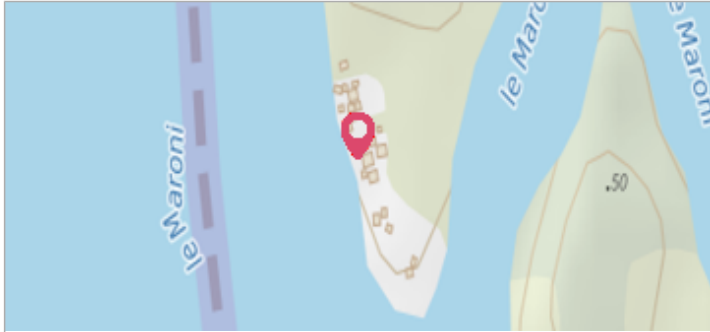


Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Village Body Campu #8****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_40**Date de mise à jour :** 08/01/2018**Auteur :** DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -54.42747500 / Y: 4.62790268**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 119617.53 / Y: 512452.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.427475 / Y: 4.6279027**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Porte à l'intérieur de la maison - laisse de crue**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_40_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHÉC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol maison**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.480 m
