
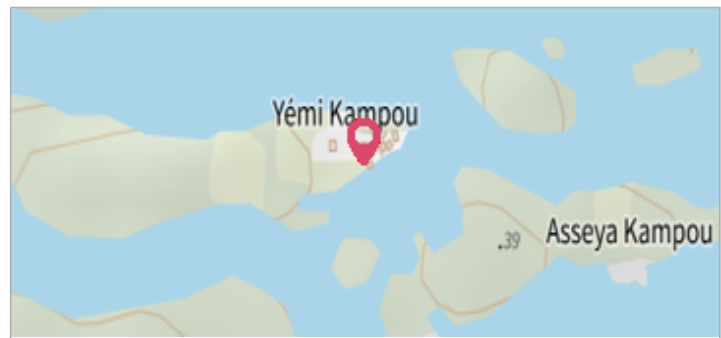


| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
|  | Commune : APATOU | Rivière : Le Maroni |
| Village Yemee Campu #1 | | 1 |
| | | Repère(s) sur le site |

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL12_S_45 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DEAL Guyane



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.41457100 / Y: 4.65955816
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 121068.24 / Y: 515950.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.414571 / Y: 4.6595582
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

| | | |
|---|------------------|---|
|  | Juin 2008 | Altitude calculée de l'eau : non déterminé |
| Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau | | Nature du repère : Témoignage oral |
| Commentaires : mur extérieur de la maison | | |

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_45_1 **Date de mise à jour :** 03/09/2019
Auteur : DEAL Guyane

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011

Méthode : Non renseigné
Organisme : BRL Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.220 m
