


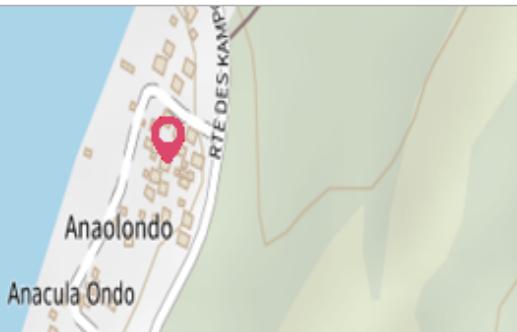

Commune : APATOU

Rivière : Le Maroni

Village Anaolando #2 - maison

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_82**Date de mise à jour :** 08/01/2018**Auteur :** DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.27658500 / Y: 5.25497047**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 136724.31 / Y: 581800.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.276585 / Y: 5.2549705**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** porte à l'intérieur de la maison - laisse de crue**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_82_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé****Nature du repère :** **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la maison**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.420 m
