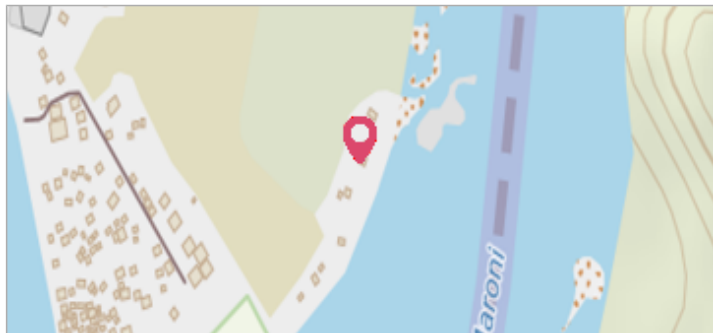


Commune : **INDEFINI**Rivière : **Le Maroni****Village Langa Tabiki #4****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_4**Date de mise à jour :** 08/01/2018**Auteur :** DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.43833200 / Y: 4.99294234**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 118614.85 / Y: 552881.02**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.438332 / Y: 4.9929423**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Mur à l'intérieur de la maison - 159cm/TN**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_4_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** dalle béton**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.390 m
