


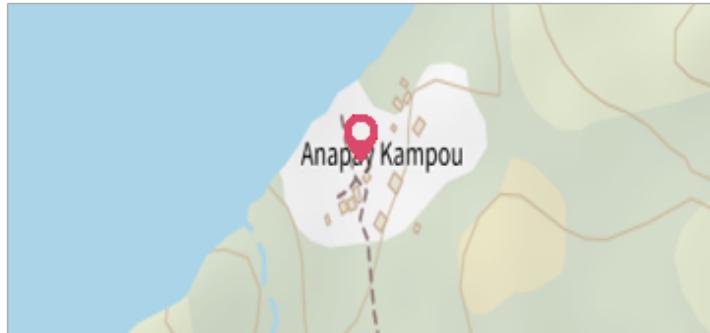

Commune : APATOU

Rivière : Le Maroni

Village Anapay Campu #3 - maison

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_8**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.35325100 / Y: 5.13626978

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 128145.09 / Y: 568702.39

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.353251 / Y: 5.1362698

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** mur extérieur**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_8_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.070 m
