



Commune : **APATOU**

Rivière : **Le Maroni**

## Village Bois Martin

**4** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL12\_S\_13

Date de mise à jour : 08/01/2018

Auteur : DEAL Guyane

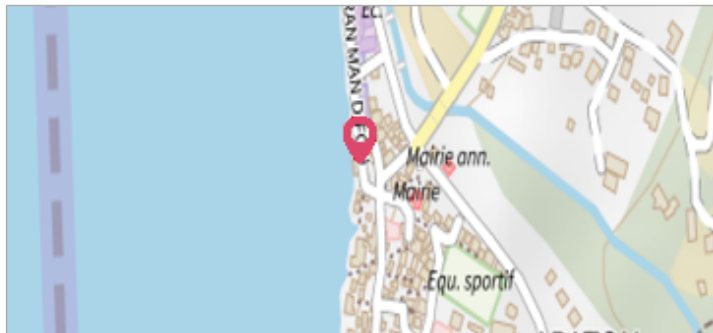

Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.43549400 / Y: 4.99042793

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118928.56 / Y: 552600.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.435494 / Y: 4.9904279

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite



### Mai 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : mur extérieur - 160cm/TN

### GÉNÉRAL

Code : GUY\_BRL12\_R\_13\_1

Date de mise à jour : 24/04/2018

Auteur : DEAL Guyane

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 29/12/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE
