


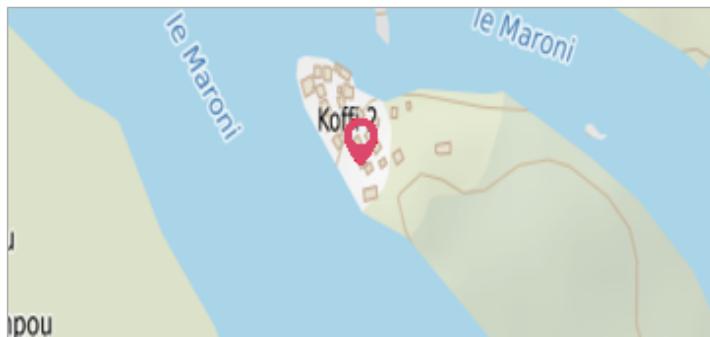

Commune : APATOU

Village Kofi #4

Rivière : Le Maroni

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_24**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.41447300 / Y: 4.61714617**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 121056.47 / Y: 511254.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.414473 / Y: 4.6171462**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** mur à l'extérieur de la terrasse**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_24_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** terrain naturel**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.510 m

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE
