


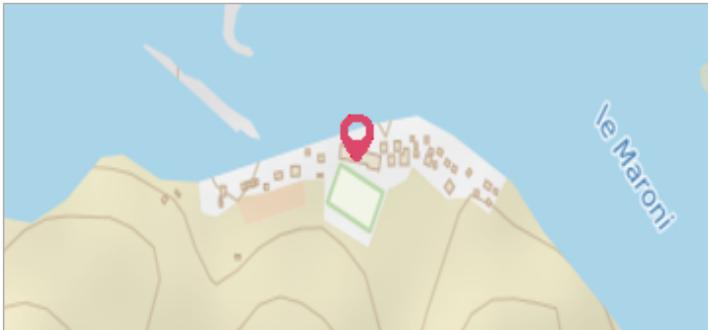

Commune : INDEFINI

Rivière : Le Maroni

Village Loka Loka - Ecole de 161 enfants côté suriname**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_55**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.43753200 / Y: 4.72041857**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 118550.21 / Y: 522702.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.437532 / Y: 4.7204186**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Gauche**Juin 2008****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Mur à l'intérieur de la classe**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_55_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre.
La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la classe**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.350 m
