


Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Village New campoe #2 - maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
 Code : GUY_BRL12_S_68 Date de mise à jour : 08/01/2018
 Auteur : DEAL Guyane

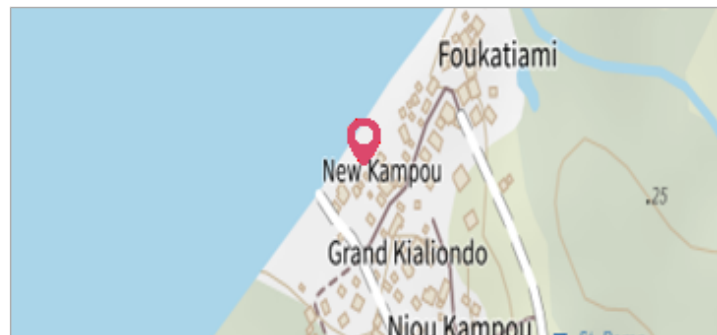

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.29264600 / Y: 5.23446498
 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 134929.74 / Y: 579539.6
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.292646 / Y: 5.234465
 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Droite

Mai 2006 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Mur à l'intérieur de la maison

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_68_1 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : DEAL Guyane



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011

Méthode : Non renseigné
 Organisme : BRL Ingénierie
 Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : carrelage
 Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m
