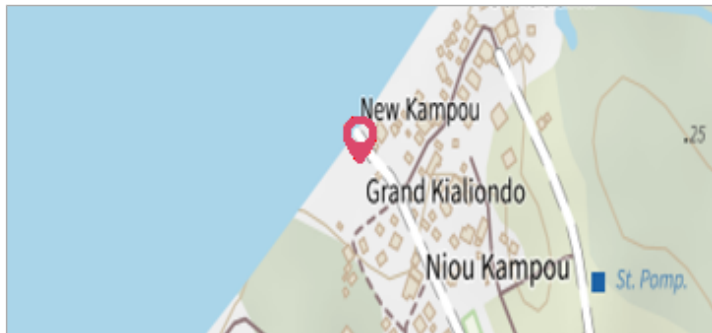


Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Village New campoe #5- maison****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL12_S_72**Date de mise à jour :** 08/01/2018**Auteur :** DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.29318000 / Y: 5.23396126**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 134870.18 / Y: 579484.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.29318 / Y: 5.2339613**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Mur à l'intérieur de la maison - laisse de crue**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL12_R_72_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.150 m
