


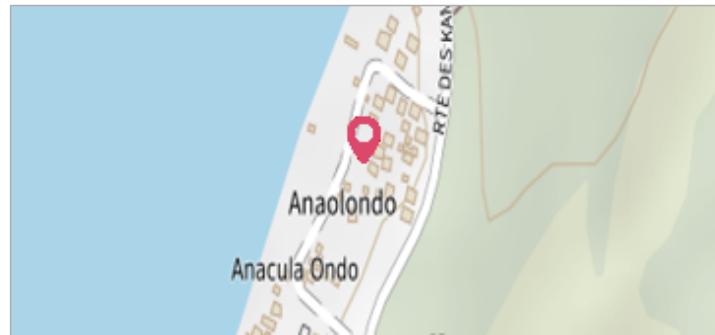

Commune : APATOU

Rivière : Le Maroni

## Village Anaolando #3 - maison

**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_83**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.27693700 / Y: 5.25476418**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 136685.12 / Y: 581777.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.276937 / Y: 5.2547642**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Mai 2006****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** mur extérieur sur la terrasse**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL12\_R\_83\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre.  
La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** carrelage**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m
