

Commune : **GRAND-SANTI** | Rivière : **Le Maroni**


Bourg

Commentaires : mur parpaing au niveau du débarcadère de Grand santi - doute sur la fiabilité du témoignage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
 Code : GUY_DEAL_S_17 Date de mise à jour : 09/01/2018
 Auteur : DEAL Guyane

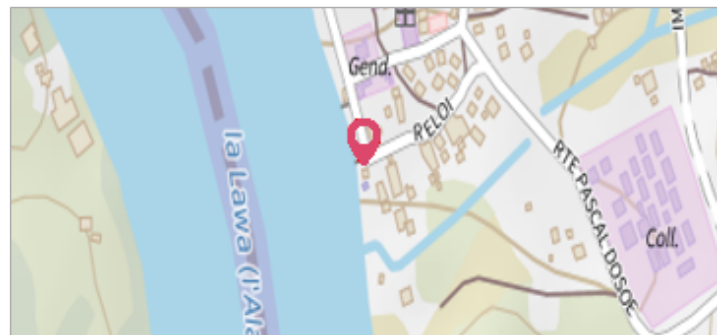

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.38135500 / Y: 4.27095299
 Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 124560.72 / Y: 472903.17
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.381355 / Y: 4.270953
 Code Hydro: 5---0000 Rive de référence: Droite

Février 2017 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : mur parpaing au niveau du débarcadère de Grand santi - doute sur la fiabilité du témoignage

GÉNÉRAL

Code : GUY_DEAL_R_17_1 Date de mise à jour : 17/04/2018
 Auteur : DEAL Guyane



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DEAL Guyane

NIVELLEMENT INITIAL - 17/05/2017

Méthode : Autre
 Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol meuble
 Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.330 m
