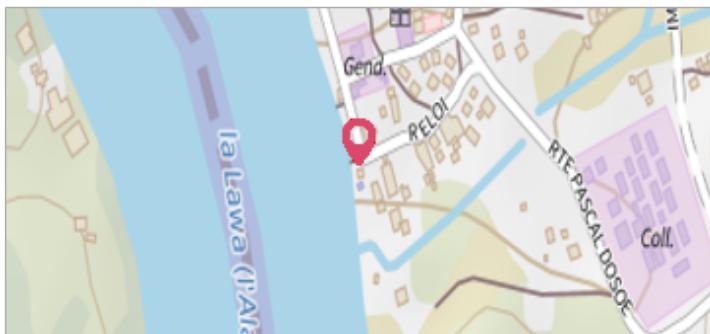


Commune : **GRAND-SANTI****Bourg**Rivière : **Le Maroni****Commentaires :** mur parpaing au niveau du débarcadère de Grand santi - doute sur la fiabilité du témoignage**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY DEAL_S_17**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 09/01/2018

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -54.38135500 / Y: 4.27095299**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 124560.72 / Y: 472903.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.381355 / Y: 4.270953**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Février 2017**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** mur parpaing au niveau du débarcadère de Grand santi - doute sur la fiabilité du témoignage**GÉNÉRAL****Code :** GUY DEAL_R_17_1**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :**

17/04/2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé****Nature du repère :** **Témoignage oral**

Vue du support de la mesure

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guyane**NIVELLEMENT INITIAL - 17/05/2017****Méthode :** Autre**Commentaires sur le niveling :** mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol meuble**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.330 m
