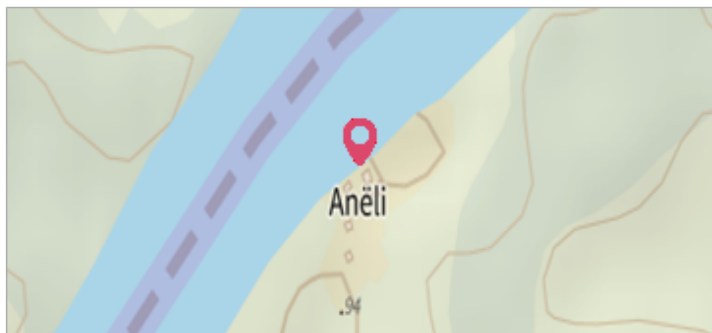


Commune : **MARIPASOULA**Rivière : **La Lawa****Village bushinengue: Anelli****Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY_BRL11_S_30**Date de mise à jour** : 15/12/2017**Auteur** : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -53.99506063 / Y: 3.57353827**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 167217 / Y: 395531**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -53.9950606 / Y: 3.5735383**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Mai 2006**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Pieds du pilotis - maison surélevée de 30 cm suite crue 2006 Pas d'inondations en 2008 grâce aux travaux**GÉNÉRAL****Code** : GUY_BRL11_R_30_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

17/04/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.530 m
