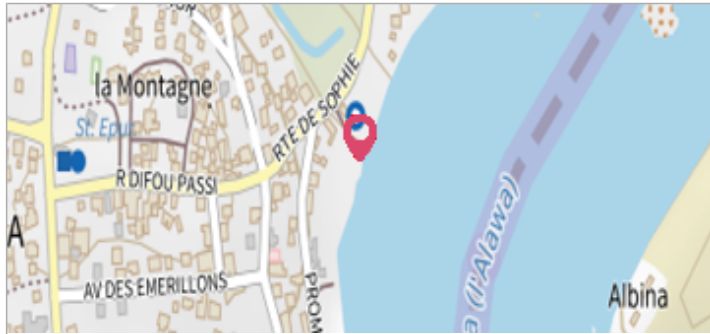


Commune : **MARIPASOULA**Rivière : **La Lawa****Bourg Maripasoula #4****Commentaires** : Fleuve Maroni/Lawa**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guyane**Code** : GUY_BRL11_S_34**Date de mise à jour** : 15/12/2017**Auteur** : DEAL Guyane

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -54.02780214 / Y: 3.64380425**Coordonnées RGFG95 UTM 22N** X: 163601.6 / Y: 403320.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -54.0278021 / Y: 3.6438042**Code Hydro**: 5---0001**Rive de référence**: Non renseigné**Mai 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : En 2006, Au niveau de la barrière blanche. Le propriétaire pouvait accoster sa pirogue au niveau de sa maison. Dépôt de graviers de la société EIFFAGE, proche du dépôt d'hydrocarbure du Conseil général.**GÉNÉRAL****Code** : GUY_BRL11_R_34_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL Guyane

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE
