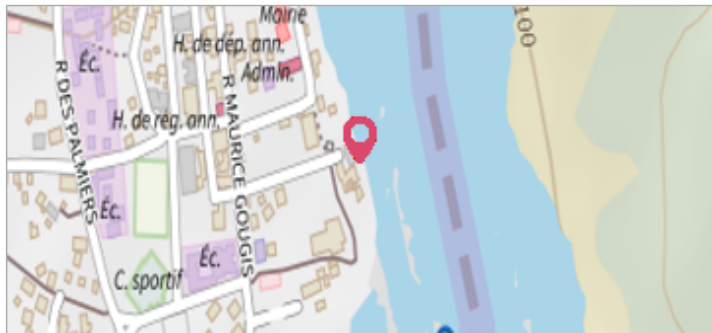


Commune : **MARIPASOULA**Rivière : **La Lawa****Bourg Maripasoula #6****Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_36**Date de mise à jour :** 15/12/2017**Auteur :** DEAL Guyane**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.02706940 / Y: 3.63964582**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 163681.54 / Y: 402860.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.0270694 / Y: 3.6396458**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné

2006

Vue globale du bâtiment

**Mai 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Traces peu visibles - Bâti en bois et tôle**GÉNÉRAL****Code :** GUY_BRL11_R_36_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

19/02/2018



2006

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.380 m
