


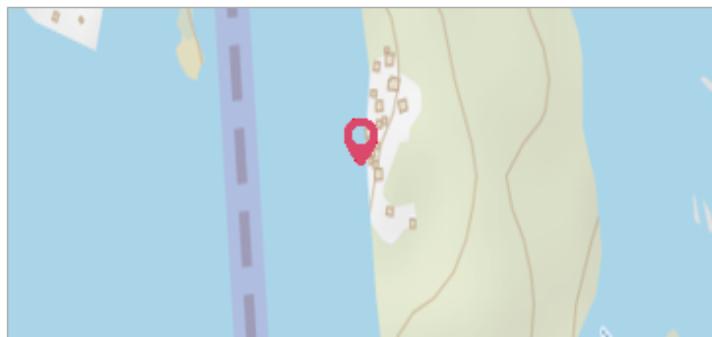


Commune : APATOU

**Village Fedy #2**

Rivière : Le Maroni

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_42**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.42820300 / Y: 4.63098705**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 119538.29 / Y: 512794.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.428203 / Y: 4.6309871**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Façade de la maison**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL12\_R\_42\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

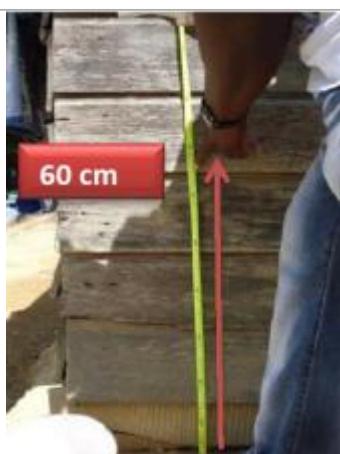

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé****Nature du repère :** **Témoignage oral****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 30/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m
