Commune : **GRAND-SANTI** | Rivière : **La Lawa**

Maison sur pilotis en béton

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_gin09_S_45 **Date de mise à jour :** 10/10/2017
Auteur : DEAL Guyane

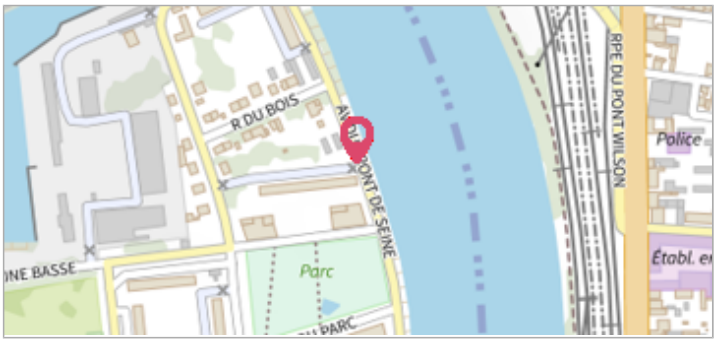

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.38909800 / Y: 4.25059700
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 123690.08 / Y: 470652.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.389098 / Y: 4.250597
Code Hydro: 5---0001 **Rive de référence:** Non renseigné

Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Niveau maximal atteint en 2006 environ 30cm plus bas

GÉNÉRAL

Code : GUY_gin09_R_45_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUSTURES POUR LA DDE DE GUYANE – MAI 2009] - 09/01/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT INITIAL - 31/01/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GINGER Environnement
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.200 m
