Commune : **PRUNIERS-EN-SOLOGNE** | Rivière : **La Sauldre**

281-282 Moulin de la Minoteries – Mur du moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CER_SAU17_S_54 **Date de mise à jour :** 27/07/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

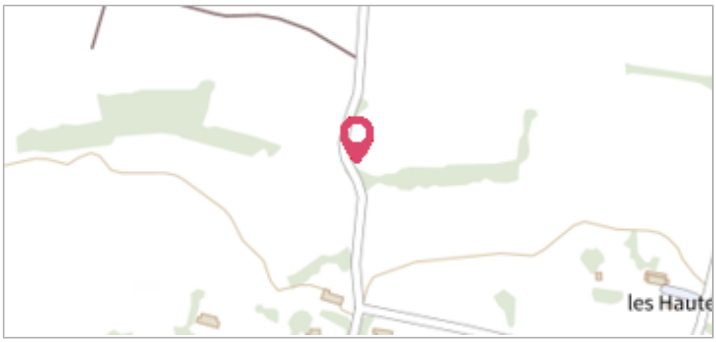

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70159600 / Y: 47.33365400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 601952.65 / Y: 6693397.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.701596 / Y: 47.333654
Code Hydro: K6--0250 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **84.17 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse d'inondation marquée sur un bâton servant de repère. Fiabilité du repère : fiable.

GÉNÉRAL

Code : CER_SAU17_R_54_1 **Date de mise à jour :** 27/07/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Commentaires sur le nivellement : Précision verticale (m) : 0,017. Précision horizontale (m) : 0,012.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 84.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 84.17 m
