Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Village Anapay Campu #4 – maison

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL12_S_9 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DEAL Guyane

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.35296200 / Y: 5.13645835
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 128177.28 / Y: 568723.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.352962 / Y: 5.1364584
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_9_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DEAL Guyane

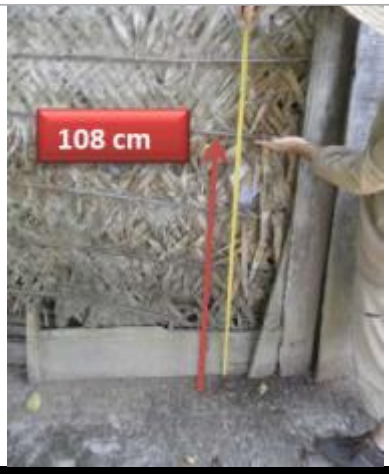

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011

Méthode : Non renseigné
Organisme : BRL Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.080 m
