Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

BOURG APATOU AKOBO – Maison

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_BRL12_S_91 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DEAL Guyane

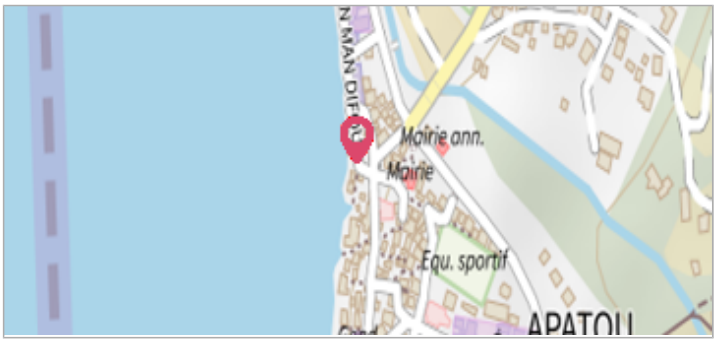

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.34445500 / Y: 5.15558481
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 129132.82 / Y: 570835.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.344455 / Y: 5.1555848
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

4 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : mur extérieur de la maison

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_91_2 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI – BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE – OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 22/08/2011

Méthode : Non renseigné
Organisme : BRL Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : terrain naturel (chemin de terre devant la maison)
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
