Commune : **AVENE** | Rivière : **L' Orb**

Sous 1, rue du Château

Commentaires : Mur de soutènement du quai des Tanneries

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_685 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

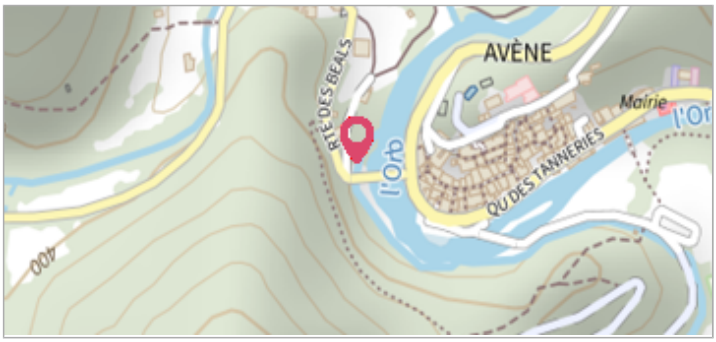

Mur de soutènement du quai des Tanneries

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.09966920 / Y: 43.75678420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 708028.2 / Y: 6295311.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0996692 / Y: 43.7567842
Code Hydro: Y25-0400 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **366.442 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace dans le lierre

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_685_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace dans le lierre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

HAUT DU MUR - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 365.442 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 366.442 m
